

Município de Ilha Comprida Estância Balneária

GABINETE DA PREFEITA



OFÍCIO Nº 087/2025/GP

Assunto: REQUERIMENTO Nº 017/2025

Ilha Comprida, 17 de Abril de 2025.

Exmo. Senhor,

Com cordiais cumprimentos, em atendimento ao Requerimento nº 017/2025, de autoria do Nobre Vereador Milton César Pires, referente ao item 1, informo que as obras da Ponte sobre o Rio Capivarú encontram-se em fase final. Ocorre que as fortes chuvas que antecederam o carnaval, causaram o desprendimento de ambas as cabeceiras, o que demandou a realização de um novo serviço para estabilização das mesmas, conforme registro fotográfico anexo.

Da mesma forma podemos ver que quase todo assoalho de madeira está repostado sobre as travessas da ponte, pois foi necessária a remoção destes para refazer as cabeceiras, com escoramento em madeira, forração de manta geotêxtil e preenchimento com rachão.

Item 2: A conclusão da ponte está prevista para o mês de abril de 2025.

Sem mais para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.



Atenciosamente,


Maristela Osório de Marques Cardona
Prefeita Municipal


Ao Exmo. Senhor
Milton Cesar Pires
Presidente da Câmara Municipal
ILHA COMPRIDA/SP


RECEBIDO EM
22 / 04 / 2025

Preenchimento das cabeceras, com a desmontagem do assoalho.

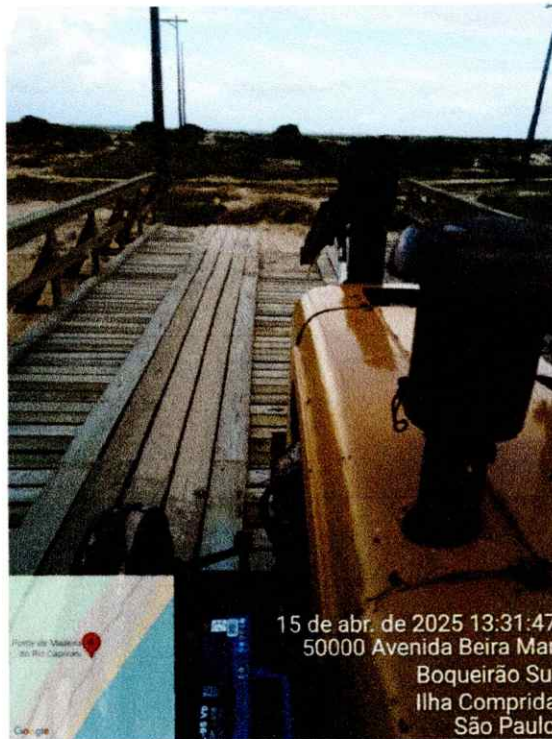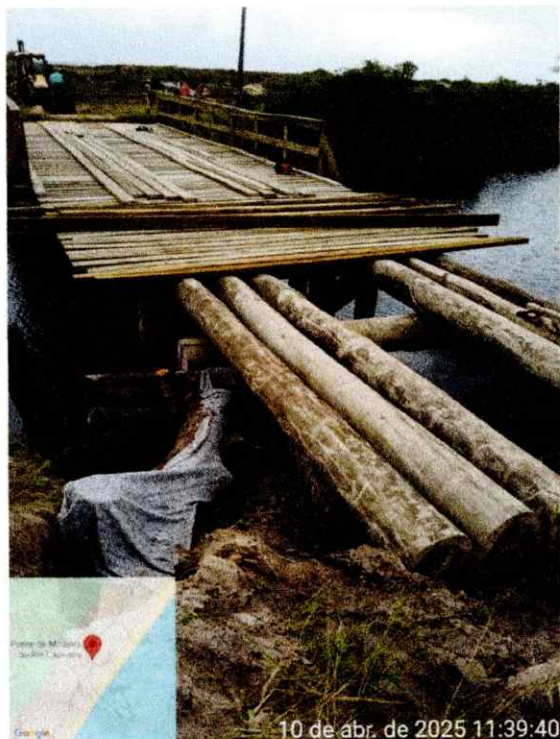

À esquerda a cabeceira do lado da Praia, com inici do preenchimento de material e à direita a cabeceira interna já concluída.

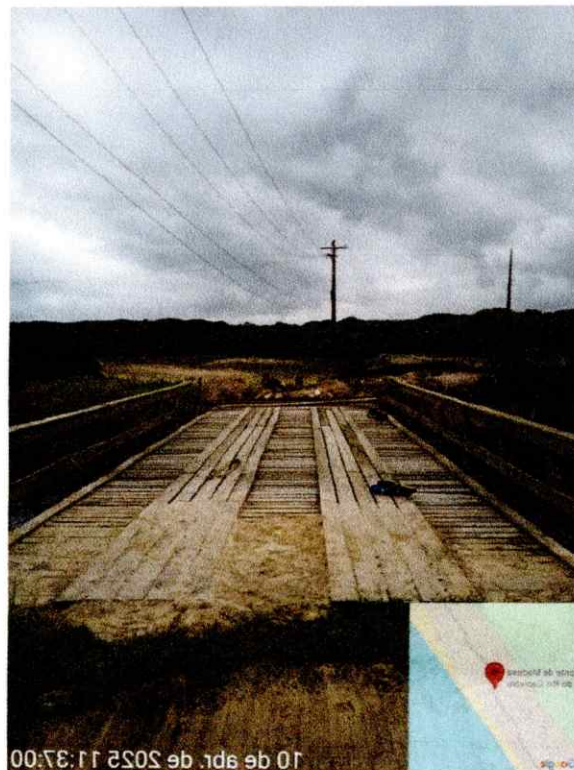

Assentamento do assoalho e defensas laterais para finalização.

